

Dossier Final

ADIIL

Organisation Projet

SAE 2.06 - TD11A

SOMMAIRE

Introduction :	2
Contexte du projet :.....	3
Objectif du projet :.....	3
Tâches et temps alloués à la tâche.....	4
Liste des trios.....	10
Tableau d'antériorité.....	11
Tableau Temps/Homme.....	15
Observation :.....	18
GANT.....	19
PERT.....	20
Tableau Productivité.....	25
Matrice d'Eisenhower.....	26
Séance du 3/03/26.....	26
Séance du 6/03/26.....	27
Séance du 10/03/26.....	29
Séance du 13/03/26.....	30
Bilan management BDE.....	31
Organigramme du BDE.....	32
Auto-évaluation.....	33
Analyse management des trios.....	36

Introduction :

Dans ce dossier nous allons planifier un voyage à Paris le 21 mai 2026. Ceci dans le cadre de la SAE 2.06 (Organisation d'un travail d'équipe). Vous avez entre les mains le dossier relatif à l'organisation du projet.

Contexte du projet :

Notre groupe de TP se met à la place de l'ADIIL, l'association des étudiants du département informatique de l'IUT de Laval.

Objectif du projet :

Nous allons donc gérer la partie relative à la gestion des coûts, de la gestion du travail et de l'organisation du voyage.

Cette journée pédagogique doit être étroitement liée au droit pour justifier de son caractère pédagogique mais pourra cependant contenir des activités plus ludiques comme une chasse au trésor et des moments d'autonomie.

Elle commencera à 4h30 et se terminera à 23h30. Durant la durée de cette période, tous les étudiants et personnels encadrants (57 personnes) s'engagent à respecter le règlement intérieur dédié à cette journée. Aucun écart de budget ne sera autorisé ce qui impliquera la création d'un budget prévisionnel strict.

Tâches et temps alloués à la tâche

Nombres total d'heures : 208h

Nombre d'heure par membre du BDE: 16h

Catégorie	Tâche à effectuer	Compétence (s) associée(s)	Groupe	Durée de la tâche
Organisation 3,25h	Réaliser le tableau des tâches	Organisation	1	1h
	Dossier gestion du temps (Planning avec zones rouge/vert)	Organisation	1	0,5h
	Lister les compagnies de bus	Organisation	2	1h
	Recensement des compétences et constitution des trios	Organisation	1	0,5h
	Tableau antériorité (Dates/Heure	Gestion de projets	3	2h

Catégorie	Tâche à effectuer	Compétence (s) associée(s)	Groupe	Durée de la tâche
	s + Fromage Suisse)			
	Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW)	Gestion de projets	1	0,5h
	Auto-évaluation individuelle sur grille (Annexe 1)	Organisation	Tous	0,5h
Gestion Projet	Réalisation des diagrammes Gantt et PERT	Gestion de projet	1	2h
	Tableau Temps/homme (Comparaison prévue vs passé)	Gestion de projet	3	1h

Catégorie	Tâche à effectuer	Compétence (s) associée(s)	Groupe	Durée de la tâche
	Bilan management BDE	Management	3	1h
	Plan d'action et analyse complète des risques	Gestion de projet	3	1h
Pédagogie	Recherche UMTICE : lien entre Droit et visite + lieu	Recherche	1	1h
	Conception et organisation du jeu de piste à Paris	Organisation	2	4h
	Présentation riche des lieux de visite prévus (Diaporama)	Communication	4	1,5h

Catégorie	Tâche à effectuer	Compétence (s) associée(s)	Groupe	Durée de la tâche
Management	Analyse du management des trios (points forts/faibles)	Management	Tous	0,5h
	Gestion administrative (Autorisations mineures, liste car J-8)	Management	4	0,5h
	Rédaction du règlement intérieur (Alcool et toxicologie)	Communication	1	1h
	Logistique car (Banalisation, contact M. Laforcade)	Management	4	0,5h
Finances	Budget prévisionnel (Charges et Ressources)	Économie	2	2h

Catégorie	Tâche à effectuer	Compétence (s) associée(s)	Groupe	Durée de la tâche
	Actions de financement BDE	Éco-gestion	4	1,5h
	Analyser les devis pour trouver le meilleur	Analyse, économie	2	1,5h
Communication & Design	Charte graphique ADIIL	Design / Graphique	4	1,5h
	Courriels (Devis car acceptation et demande)	Communication	2	0,5h
	Rédaction du programme de la journée pour les participants	Communication, Organisation	1	1h
	Rédaction du mail au directeur de l'iut	Communication	4	0,5h

Catégorie	Tâche à effectuer	Compétence (s) associée(s)	Groupe	Durée de la tâche
Finalisation	Montage du dossier final (Chemise cartonnée à élastique)	Secrétariat	3 / 4	1,5h

Pour la durée des tâches nous avons choisi de prendre le temps réel d'une tâche, c'est-à-dire que si dans notre liste des tâches il y en a une qui fait 1 heure, peu importe le nombre de personnes la tâche prendra une heure.

Liste des trios

Liste des compétences : Économie, Analyse, Éco-gestion, Gestion de projet, Design / Graphique, Management, Communication, Organisation, Secrétariat, Recherche, Orthographe

Prénom Nom	Compétences	Numéros de groupe
Maxence Binet	Gestion de projet, Management, Communication, Secrétariat	1
Marine Estarellas	Graphisme, Management, Communication, Secrétariat, Recherche, Organisation	4
Matthias De Oliveira	Orthographe, Économie	2
Edgar Bacquaert	Gestion de projet, Économie	4
Axel Hamard	Orthographe, graphisme, communication, Management	4
Nathan Mareau	Orthographe, Économie, Recherche	2
Charly Piel	Orthographe, Économie, Recherche	2
Titouan Thebert	Orthographe, Management, Recherche	1
Berat Dastan	Orthographe, Management, Communication, Recherche	1

Prénom Nom	Compétences	Numéros de groupe
Célian Gloro	Orthographe, Organisation, Recherche	3
Léo Serveau	Organisation, Orthographe, Gestion projet, Design, Recherche	3
Mustafa Cafilé	Organisation, Orthographe, Gestion projet, Recherche	3
Hadiatou Barry	Communication, Orthographe , Recherche	4

Tableau d'antériorité

Tâche	Nom	Durée	Antériorité
A	Réaliser le tableau des tâches	1h	-
B	Dossier gestion du temps (Planning avec zones rouge/vert)	0,5h	A
C	Recensement des compétences et constitution des trios	0,5h	B

Tâche	Nom	Durée	Antériorité
D	Tableau antériorité (Dates/Heures + Fromage Suisse)	2h	A
E	Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW)	0,5h	D
F	Auto-évaluation individuelle sur grille (Annexe 1)	0,5h	E4
G	Réalisation des diagrammes Gantt et PERT	2h	D
H	Tableau Temps/homme (Comparaison prévue vs passé)	1h	O
I	Bilan management BDE	1h	N
J	Plan d'action et analyse complète des risques	1h	G
K	Recherche UMTice : lien entre Droit et visite + lieu	1h	R

Tâche	Nom	Durée	Antériorité
L	Conception et organisation du jeu de piste à Paris	4h	K
M	Présentation riche des lieux de visite prévus (Diaporama)	1,5h	L
N	Analyse du management des trios (points forts/faibles)	0,5h	H
O	Gestion administrative (Autorisations mineures, liste car J-8)	0,5h	Z
P	Rédaction du règlement intérieur (Alcool et toxicologie)	1h	Q
Q	Logistique car (Banalisation, contact M. Laforcade)	0,5h	Z
R	Budget prévisionnel (Charges et Ressources)	2h	-
S	Actions de financement	1,5h	R

Tâche	Nom	Durée	Antériorité
	BDE		
T	Charte graphique ADIIL	1h	L
U	Courriels (Devis car acceptation et demande)	0,5h	α
W	Rédaction du programme de la journée pour les participants	1h	L
X	Rédaction du mail au directeur de l'iut	0,25h	M
Y	Montage du dossier final (Chemise cartonnée à élastique)	1,5h	I
Z	Analyser les devis pour trouver le meilleurs	1,5h	U
α	Lister les compagnie de bus	1h	W
E2	Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW)	0,5h	L

Tâche	Nom	Durée	Antériorité
E3	Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW)	0,5h	Z
E4	Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW)	0,5h	I

Tableau Temps/Homme

Nom de la tâche	Temps prévu Temps/Homme	Durée réel Temps/Homme
Réaliser le tableau des tâches	3h	2.5h
Dossier gestion du temps (Planning avec zones rouge/vert)	1,5h	1.5h
Recensement des compétences et constitution des trios	1,5h	1.5h
Tableau antériorité (Dates/Heures + Fromage Suisse)	6h	6.5h

Nom de la tâche	Temps prévu Temps/Homme	Durée réel Temps/Homme
Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW)	1,5h	1.5h
Auto-évaluation individuelle sur grille (Annexe 1)	1,5h	1.5h
Réalisation des diagrammes Gantt et PERT	6h	6h
Tableau Temps/homme (Comparaison prévu vs passé)	3h	3h
Bilan management BDE	3h	3h
Plan d'action et analyse complète des risques	3h	2.5h
Recherche UMTICE : lien entre droit et visite + lieu	3h	3h
Conception et organisation du jeu de piste à Paris	12h	11h


Nom de la tâche	Temps prévu Temps/Homme	Durée réel Temps/Homme
Présentation riche des lieux de visite prévus (Diaporama)	6h	6h
Analyse du management des trios (points forts/faibles)	1,5h	1h
Gestion administrative (Autorisations mineurs, liste car J-8)	2h	2h
Rédaction du règlement intérieur (Alcool et toxicologie)	3h	2.5h
Logistique car (Banalisation, contact M. Laforcade)	2h	4h
Budget prévisionnel (Charges et Ressources)	6h	4.5h
Actions de financement BDE	6h	0.5h
Charte graphique ADIIL	4h	4h

Nom de la tâche	Temps prévu Temps/Homme	Durée réel Temps/Homme
Courriels (Devis car acceptation et demande)	1,5h	1.5h
Rédaction du programme de la journée pour les participants	3h	3h
Rédaction du mail au directeur de l'iut	1h	0.5h
Montage du dossier final (Chemise cartonnée à élastique)	4.5h	h
Analyser les devis pour trouver le meilleur	4.5h	3h
Lister les compagnie de bus	3h	2h


Observation :

La différence entre les prévisions et la réalité est assez faible pour la majeure partie des tâches principalement grâce à l'organisation du groupe et la répartition efficace du travail.

GANT

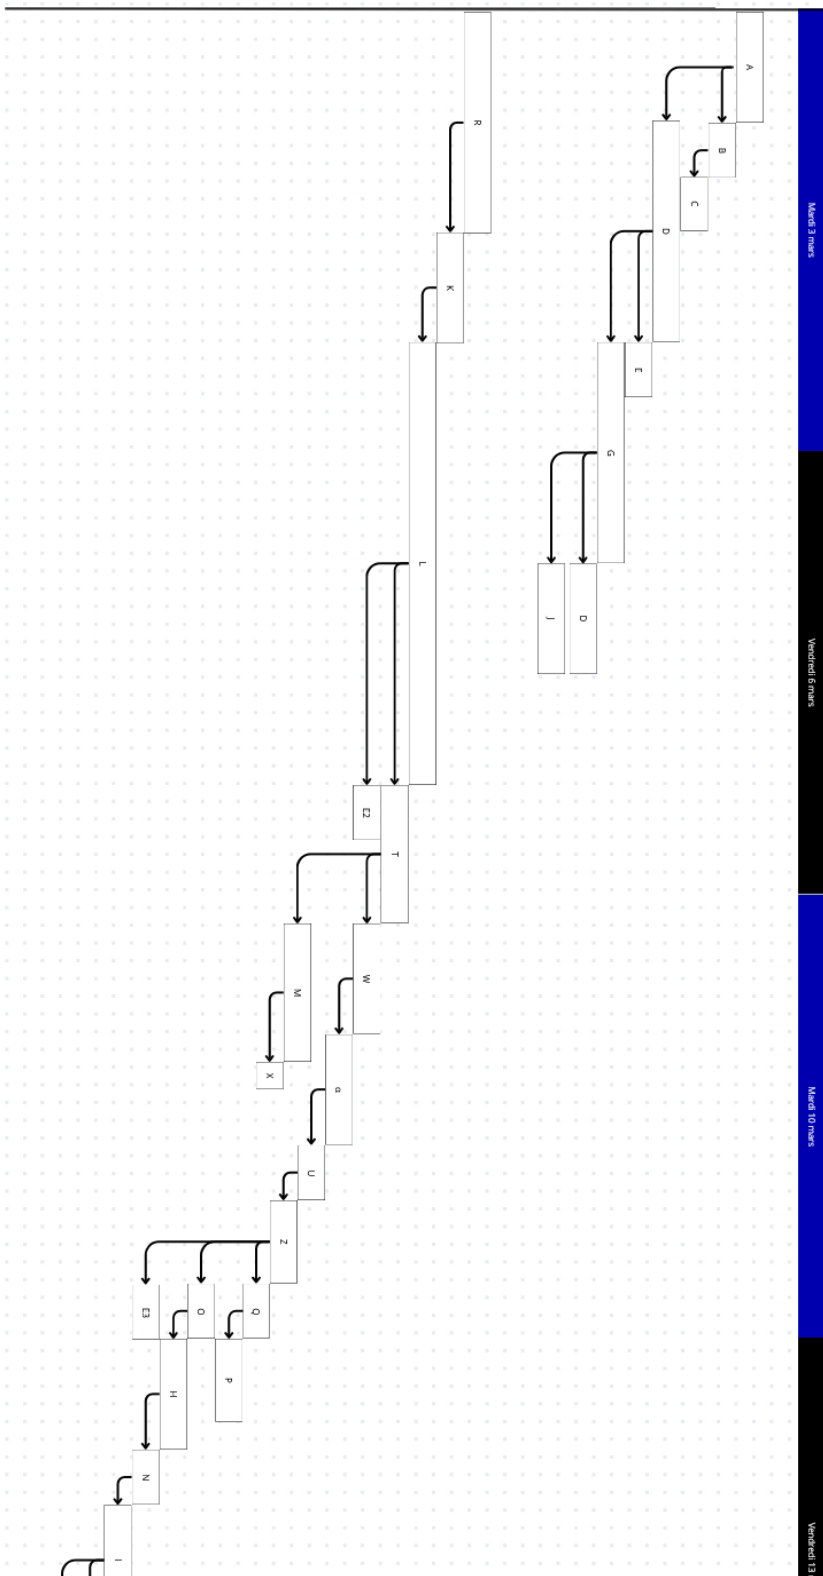

PERT

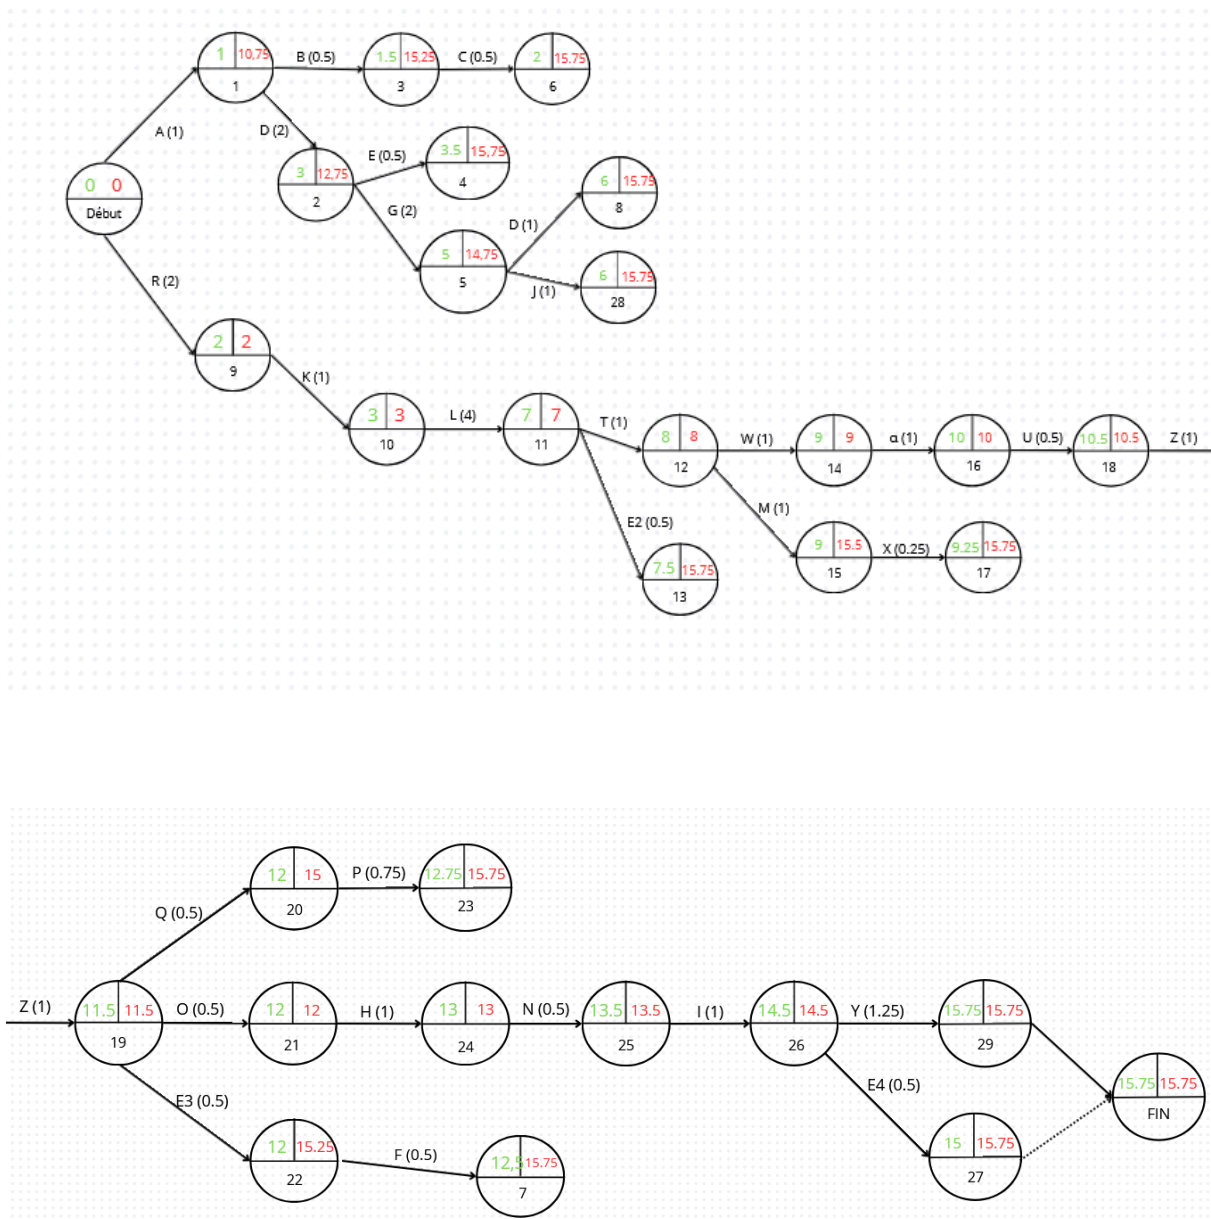

Tâche	Nom	Marge libre (en heure)	Marge Total (en heure)
A	Réaliser le tableau des tâches	0	9,75
B	Dossier gestion du temps (Planning avec zones rouge/vert)	0	13,75
C	Recensement des compétences et constitution des trios	0	13,75
D	Tableau antériorité (Dates/Heures + Fromage Suisse)	0	9,75
E	Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW)	0	7,75
F	Auto-évaluation individuelle sur grille (Annexe 1)	0	3,25
G	Réalisation des diagrammes Gantt et PERT	0	9,75

Tâche	Nom	Marge libre (en heure)	Marge Total (en heure)
H	Tableau Temps/homme (Comparaison prévu vs passé)	0	0
I	Bilan management BDE	0	0
J	Plan d'action et analyse complète des risques	0	9,75h
K	Recherche UMTice : lien entre Droit et visite + lieu	0	0
L	Conception et organisation du jeu de piste à Paris	0	0
M	Présentation riche des lieux de visite prévus (Diaporama)	0	6,5h
N	Analyse du management des trios (points forts/faibles)	0	0
O	Gestion administrative (Autorisations mineurs, liste car J-8)	0	0

Tâche	Nom	Marge libre (en heure)	Marge Total (en heure)
P	Rédaction du règlement intérieur (Alcool et toxicologie)	0	3h
Q	Logistique car (Banalisation, contact M. Laforcade)	0	3h
R	Budget prévisionnel (Charges et Ressources)	0	0
S	Actions de financement BDE	0	12,25h
T	Charte graphique ADIIL	0	0
U	Courriels (Devis car acceptation et demande)	0	0
W	Rédaction du programme de la journée pour les participants	0	0
X	Rédaction du mail au directeur de l'iut	0	6,5h
Y	Montage du dossier final (Chemise cartonnée à	0	0

Tâche	Nom	Marge libre (en heure)	Marge Total (en heure)
	élastique)		
Z	Analyser les devis pour trouver le meilleurs	0	0
α	Lister les compagnie de bus	0	0
E2	Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW)	0	8,25h
E3	Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW)	0	3,25h
E4	Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW)	0	0,75h

Tableau Productivité

Prénom Nom	Mardi 8h-12h	Vendredi 13h30-17h 30	Mardi 8h-12h	Vendredi 13h30-17h 30
Maxence Binet				
Marine Estarellas				
Matthias De Oliveira				
Edgar Bacquaert				
Axel Hamard				
Nathan Mareau				
Charly Piel				
Titouan Thebert				
Berat Dastan				
Célian Gloro				
Léo Serveau				
Mustafa Cafile				
Hadiatou Barry				

Matrice d'Eisenhower

Séance du 3/03/26

	Urgent	Pas urgent
Important	1. Réaliser le tableau des tâches 2. Dossier gestion du temps (Planning avec zones rouge/vert) 3. Recensement des compétences et constitution des trios	1. Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW) 2. Plan d'action et analyse complète des risques 3. Conception et organisation du jeu de piste à Paris 4. Budget prévisionnel (Charges et Ressources) 5. Action de financement du BDE
Pas important	1. Tableau antériorité (Dates/Heures + Fromage Suisse) 2. Recherche UMTICE : lien entre droit et visite + lieu	1. Gestion administrative (Autorisations mineures, liste car J-8)

Séance du 6/03/26

	Urgent	Pas urgent
Important	1. Recherche UMTICE : lien entre droit et visite + lieu 2. Conception et organisation du jeu de piste à Paris 3. Logistique car (Banalisation, contact M. Laforcade) 4. Tableau antériorité (Dates/Heures + Fromage Suisse)	1. Réalisation des diagrammes Gantt et PERT 2. Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW) 3. Charte graphique ADIIL
Pas important		

Séance du 10/03/26

	Urgent	Pas urgent
Important	1. Charte graphique ADIIL 2. Lister les compagnies de bus 3. Rédaction du programme de la journée pour les participants 4. Présentation riche des lieux de visite prévus	1. Analyser les devis pour trouver le meilleur 2. Logistique car (Banalisation, contact M. Laforcade) 3. Gestion administrative (Autorisations mineurs, liste car J-8) 4. Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW) 5. Montage du dossier final (Chemise cartonnée à élastique) 6. Bilan Management du BDE
Pas important	1. Rédaction du mail au directeur de l'iut 2. Courriels (Devis car acceptation et demande)	1. Auto-évaluation individuelle sur grille (Annexe 1)

Séance du 13/03/26

	Urgent	Pas urgent
Important	1. Tableau Temps/homme (Comparaison prévu vs passé) 2. Rédaction du règlement intérieur (Alcool et toxicologie) 3. Analyse du management des trios (points forts/faibles) 4. Bilan Management du BDE 5. Montage du dossier final (Chemise cartonnée à élastique)	2. Suivi d'avancement (Matrice Eisenhower ou MOSCOW) 3. Auto-évaluation individuelle sur grille (Annexe 1)
Pas important		

Bilan management BDE

- Y a-t-il eu un leader ? Comment a-t-il été proclamé ?

Il y a eu deux leaders : Maxence et Marine
Ils ont été proclamés naturellement

- Quel type de leadership a-t-il utilisé ?

C'est le leadership participatif qui a été utilisé.

- Quelles observations et propositions pouvez-vous lui faire ?

- Comment les tâches ont-elles été distribuées au sein de votre BDE ?

Les tâches ont été répartie par groupe et en fonction des compétences de chaque groupe.

Au sein de notre groupe, nous nous sommes divisés en 3 groupes de 3 et un groupe de 4.

Chaque groupe s'est vu assigner une tâche selon ses compétences. Le groupe 1 s'occupait des tâches liées au management et à la communication (PERT, règlement intérieur, programme). Le groupe 2 s'est occupé de l'économie et d'un peu de communication. Le groupe 3 s'est focalisé sur la gestion de projet, l'organisation et l'orthographe. Puis, le groupe 4 a fait une grosse partie de la communication avec les mails de l'organisation, les listes, la charte graphique, le diaporama, etc.

- Quel contrôle temps a été adopté ?


Nous regardions si on était en retard ou en avance par rapport au Gantt.

Nous avons utilisé un contrôle par suivi du planning avec un diagramme de Gantt. Nous avons régulièrement comparé l'avancement réel du projet avec les dates prévues afin de vérifier si nous étions en avance, à l'heure ou en retard sur les tâches planifiées.

Chaque groupe faisait aussi le point en fin de séance pour savoir s'ils étaient bien avancés ou non.

Au final on avait tout de même une assez grande marge par rapport au Gantt.

Organigramme du BDE

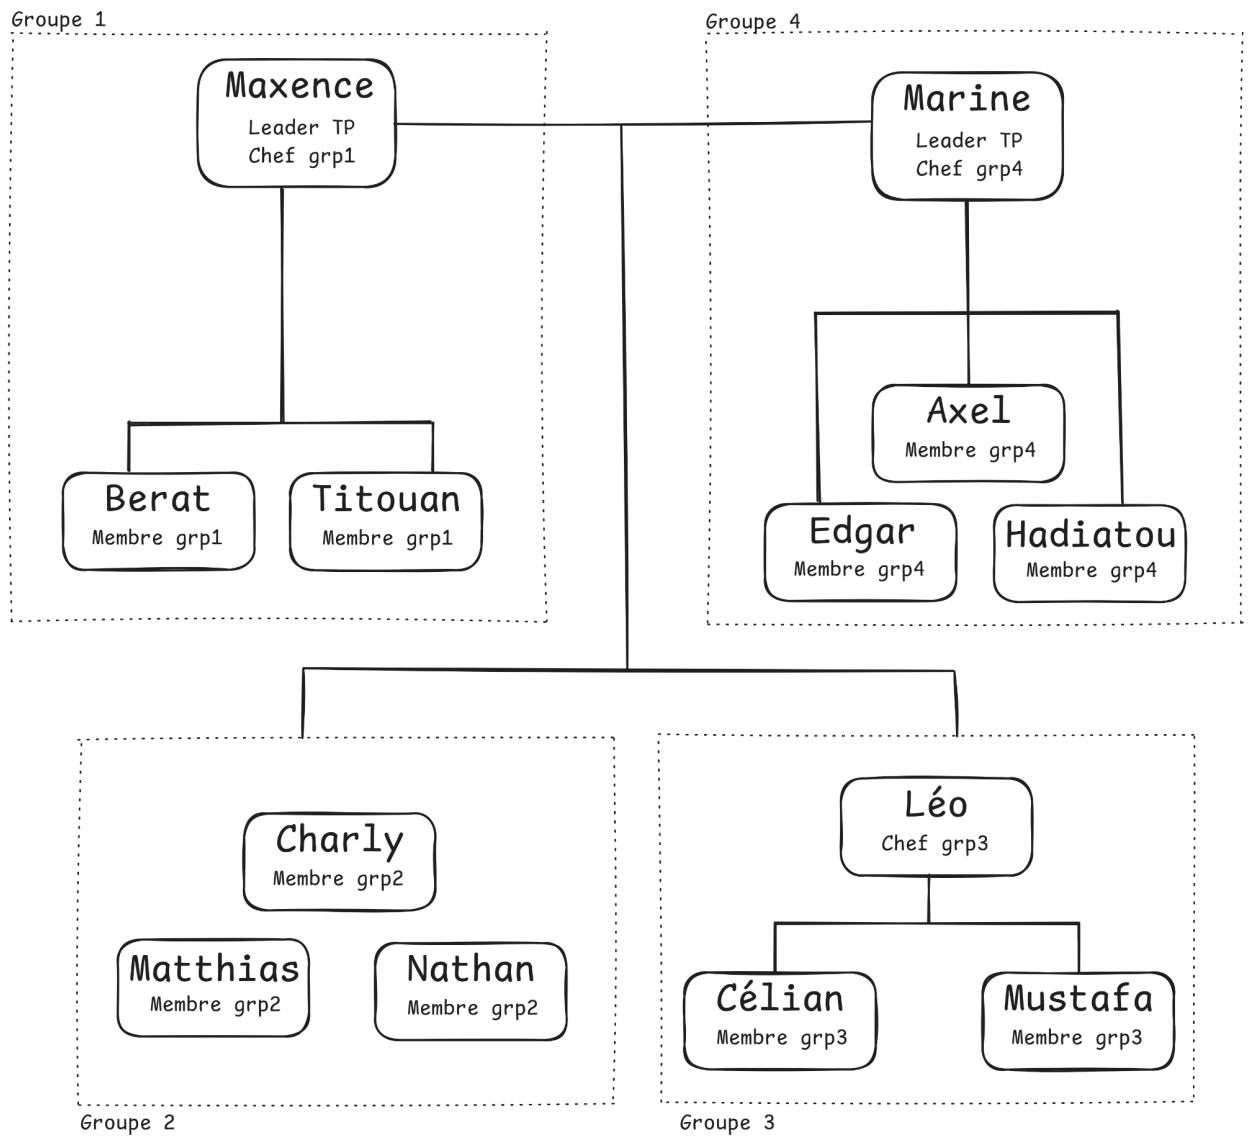

Auto-évaluation

Annexe 1 : Grille d'auto-évaluation du travail de groupe

Membres du groupe :

Groupe (noter son prénom dans la case qui nous convient):

Le groupe TP à souhaiter remplir l'annexe tous ensemble plutôt que par trio, car l'entraide a été significative entre le groupe, si bien que la séparation en trio n'a pas été marquante.

ANALYSE DES APTITUDES AU TRAVAIL D'ÉQUIPE					
ÊTRE ASSIDUS	J'étais absent sans prévenir les autres	J'étais absent, mais j'ai prévenu les autres	Je suis arrivé en retard sans prévenir les autres	Je suis arrivé en retard, mais j'ai prévenu les autres	Tous les membres du groupe étaient présents à l'heure convenue
Prénoms		Axel	Edgar	Nathan Berat	Hadiatou Marine Léo Matthias Charly Titouan Célian Maxence Mustafa
PRODUIRE	Je n'ai rien produit durant la séance.	Ce que j'ai produit est un minimum et ne correspond pas à ce qui est attendu	Ce que j'ai produit est un minimum qui correspond à ce qui est attendu	Ce que j'ai produit est incomplet mais va dans le sens du travail attendu	Ce que j'ai produit est complet et satisfait toutes les exigences du travail attendu
Prénoms				Edgar Charly Axel	Marine Matthias Titouan Nathan Léo Mustafa

					Berat Hadiatou Célian Maxence
ÊTRE AUTONOMES	J'ai été incapable de me mettre au travail	Je me suis mis au travail mais j'ai abandonné rapidement	Je me suis mis au travail mais j'ai eu du mal à terminer ce qui était prévu	Je me suis mis au travail aisément mais j'ai eu besoin d'aide pour terminer	Je me suis mis rapidement au travail et j'ai terminé dans les temps
Prénoms				Edgar Marine Charly Léo Titouan Berat Mustafa Maxence Célian Axel	Hadiatou Matthias
TRAVAILLER EN ÉQUIPE	Un ou plusieurs membres du groupe perturbent le groupe par leurs comportements. Le travail n'avance pas.	Un ou plusieurs membres du groupe se désintéressent du groupe et du travail sans toutefois perturber le groupe.	Un ou plusieurs membres du groupe sont intégrés au groupe mais se contentent de suivre le mouvement	Tous les membres du groupe sont actifs	Un ou plusieurs membres du groupe sont des éléments moteurs et font progresser le travail
Prénoms				Hadiatou Marine Charly Titouan Edgar Nathan Berat	Matthias Léo

				Mustafa Célian Maxence Axel	
CRÉER INVENTE R	Nous n'avons eu aucune idée.	Nous avons récupéré des idées venant des autres groupes, mais nous n'avons pas donné suite.	Nous avons eu des idées mais pas vraiment en rapport avec le travail à réaliser.	Nous avons eu des idées qui vont dans le sens du travail à réaliser, mais nous n'avons pas su les mettre en œuvre.	Nous avons eu des idées originales qui vont dans le sens du travail à réaliser et nous avons su les mettre en œuvre.
Prénoms				Edgar Léo Célian	Marine Matthias Charly Titouan Nathan Berat Axel Hadiatou Maxence Mustafa
PRÉVOIR	Nous n'avons pas réfléchi à notre organisation pour la prochaine séance	Nous avons réfléchi à des tâches pour la prochaine séance sans les écrire	Nous avons réfléchi à des tâches pour la prochaine séance et nous les avons notées dans le désordre	Nous avons noté les tâches pour la prochaine séance et nous les avons déjà réparties entre nous	Nous avons noté, réparti et organisé dans le temps les tâches pour la prochaine séance
Prénoms				Léo Matthias Célian Maxence Mustafa	Marine Charly Titouan Edgar Nathan Berat Hadiatou

					Axel
--	--	--	--	--	------

Corrections envisageables : aucun

Analyse management des trios

Groupe 1 :

Points forts	Points faibles
• Autonome • Efficace • Entraide	
Synthèse : • Management ○ Bonne communication dans le groupe. • Analyse du groupe de travail ○ Le travail à bien été répartie entre les membres du groupe, mais la productivité n'était pas régulière • Compétences ○ La SAE nous a notamment permis d'améliorer nos compétences de gestion de projet, avec notamment PERT et Gantt.	

Groupe 2 :

Points forts	Points faibles
• Autonomie • La Bonne ambiance • La Présence • Rapidité • Perfectionnisme	• Trop fort
Synthèse : • Management ○ Bonne communication dans le groupe • Analyse du groupe de travail ○ Le travail a bien été réparti entre les membres du groupe • Compétences ○ La SAE nous a notamment permis d'améliorer nos compétences de gestion de projet	

Groupe 3 :

Points forts	Points faibles
• Efficace • Qualité visuel • Perfectionnisme • Rapidité	
Synthèse : • Management ◦ Communication suffisante au sein du groupe. Une absence qui ne s'est pas trop fait ressentir (télétravail). • Analyse du groupe de travail ◦ Le travail n'à pas forcément été répartie de manière égal, mais le travail à été fait de manière correct • Compétences ◦ La SAE nous a appris à réaliser un fromage suisse, un organigramme.	

Groupe 4 :

Points forts	Points faibles
• Efficacité • Autonomie • Rapidité • Productivité	• Communication • Investissement
Synthèse : • Management ◦ Peu de communication mais une bonne organisation ◦ Bonne répartition du travail ◦ Variation de la productivité • Analyse du groupe de travail ◦ Quelques absences ◦ Bonne entente • Compétences ◦ Compilation de dossier ◦ Chartes graphiques ◦ Écriture de mail officiels ◦ Demande de subvention ◦ Gestion administrative ◦ Organisation du travail en grosse équipe	

Difficultés rencontrées :

Certains étudiants ont été absents ou en retard de manière récurrente, de plus certains étudiants ont eu un manque d'investissement de de productivité.
